

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20160113

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	P R É S E N T	A B S E N T	DIF FUS ION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570 00	n.rohland@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau@idverde.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudouin@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	GADEAUD	David	ID VERDE	06 81 57 22 30	david.gadeaud@idverde.com			

M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@marcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	FION	Maxime	MarcelVillette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marcel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@prunevieille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@prunevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M m e	LEMERLE HEUDEBRAN	Pauline	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran@lascaux-mobilier-urbain.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- sans objet

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

Désignation	Ref	In d	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input checked="" type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobiliert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à				

grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchien	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2016
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015

Géotextile	4	01	✓	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	✓	18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01	✓	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	✓	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	✓	18/11/2015
Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- Pose du dallage : 15%
- Pose de polystyrène agrofiltre en cours : 80% reste jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 80%

Points particuliers abordés ce jour :

- **Espaces verts :**
 - **Visite en pépinière envisagée 25 et 26/1 pour début de plantations début février**

- Arbre prévu au projet dans la terrasse perdue à côté de l'escalier sur Rue de Bezons abandonné (voir photo).
- Jardinière en pied d'escalier rue de Bezons à modifier : plan d'Exe à corriger + Panneau à déplacer
- Armoire de gestion arrosage à mettre en place à gauche de l'armoire électrique existante (SEIFEL)
- Problème esthétique sur étanchéité à solutionner : voir photo
- **Lot VRD :**
 - Fuite d'eau constatée au niveau du parking Fontaine sous bureau de police. Problème à régler hors marché —> M MALLIER s'en charge
 - Intervention ERDF pour 1bis prévue en janvier non réalisée à ce jour et sans information sur la date d'intervention alors que la zone doit être libre pour début février . M Mallier relance ERDF
 - Bornes escamotables existantes déposées et reposées avec reconstruction de la boucle de détection
 - Première marche de l'escalier accès impôts sera de 10cm au lieu de 16 en raison de sa couverture en dallage (voir photo) : accepté
 - Le rejet du drainage des jardinières de rampe se feront en gargouille dans la bordure située devant
 - Présentation de la contre marche en pierre bleue du Henault flammé, à valider par MOA
 - Rampe d'accès centre de loisirs : difficulté pour mise en accessibilité PMR, la grille existante devra être modifiée (non prévu au marché)
 - Ralentisseur rue Beau : 1 place de stationnement existante sera supprimée. Un aquadrain devra être placé de chaque côté pour garantir l'écoulement pluvial : non prévu au marché
- **Lot Eclairage public :**
 - Pose des 4 massifs dans les espaces verts et tirage des câbles en cours. Installation des candélabres début février

Documents remis ce jour :

- Devis pour déflachage sous jardinière et canalisation fonte pour évacuation EP jardinière (voir CR précédent) : 1440€ HT


Rappels :

- sans objet

Prochaines réunions :

- - **le 20/1/2016 à 14H00 sur le chantier.**

Photos / Annexes :

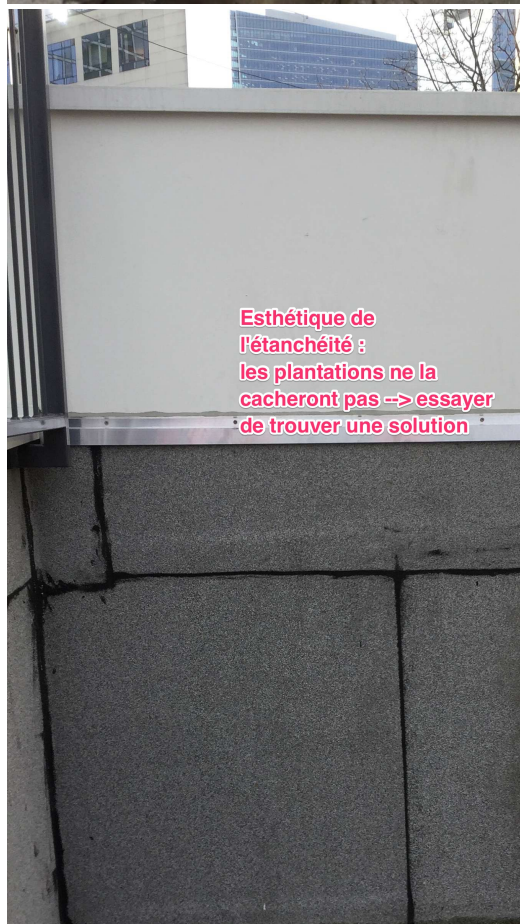



fuite sur coude dans sous sol
sous poste de police



Contre marche à valider
