N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
1		Installation et implantation de chantier	2 jours
2		Décapage de la terre végétale et mise en stock sur place	5 jours
3		Démolition du parking PL sur l'emprise du bassin	2 jours
4		Terrassement du bassin et mise en remblais + chaux	4 jours
5		Terrassement de la plateforme en déblais et mise en remblais + chaux	2 jours
6		Poste de relèvement EP et raccordement au bassin existant	3 jours
7		Assainissement EP	40 jours
8		Poste de relèvement Eu et raccordement au domaine public	2 jours
9		Assainissement EU	8 jours
10		Traitement de la plateforme Batiment au liant routier	3 jours
11		Délai de murissement	10 jours
12		Intervention du lot GO	1 jour?
13		Traitement de la voirie lourde au liant routier	3 jours
14		Terrassement et coulage des murs de soutènement	6 jours
15		Remblais technique au droit des murs	4 jours
16		Réalisation des bordures chasses roues maçonnées	3 jours
17		Muret de soubassement sous cloture	6 jours
18		Pose de la cloture	7 jours
19		Réseau Incendie	15 jours
20		Réseau AEP et RIA	15 jours
21		Mise en œuvre d'EME 0/14 sur 6 cm	2 jours
22		Réalisation de l'étanchéité du bassin	6 jours
23		Terrassement, pose des cuves incendies	7 jours
24		Bordurettes P1 en périphérie du batiment + galets	7 jours
25		Bordures T2 coulées en place sur l'EME	4 jours
26		Réalisation des dalles béton	6 jours
27		Reprise et mise en œuvre de terre végétale	5 jours
28		Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement	2 jours
29		Signalisation horizontale et verticale	2 jours
30		Portails motorisées	3 jours

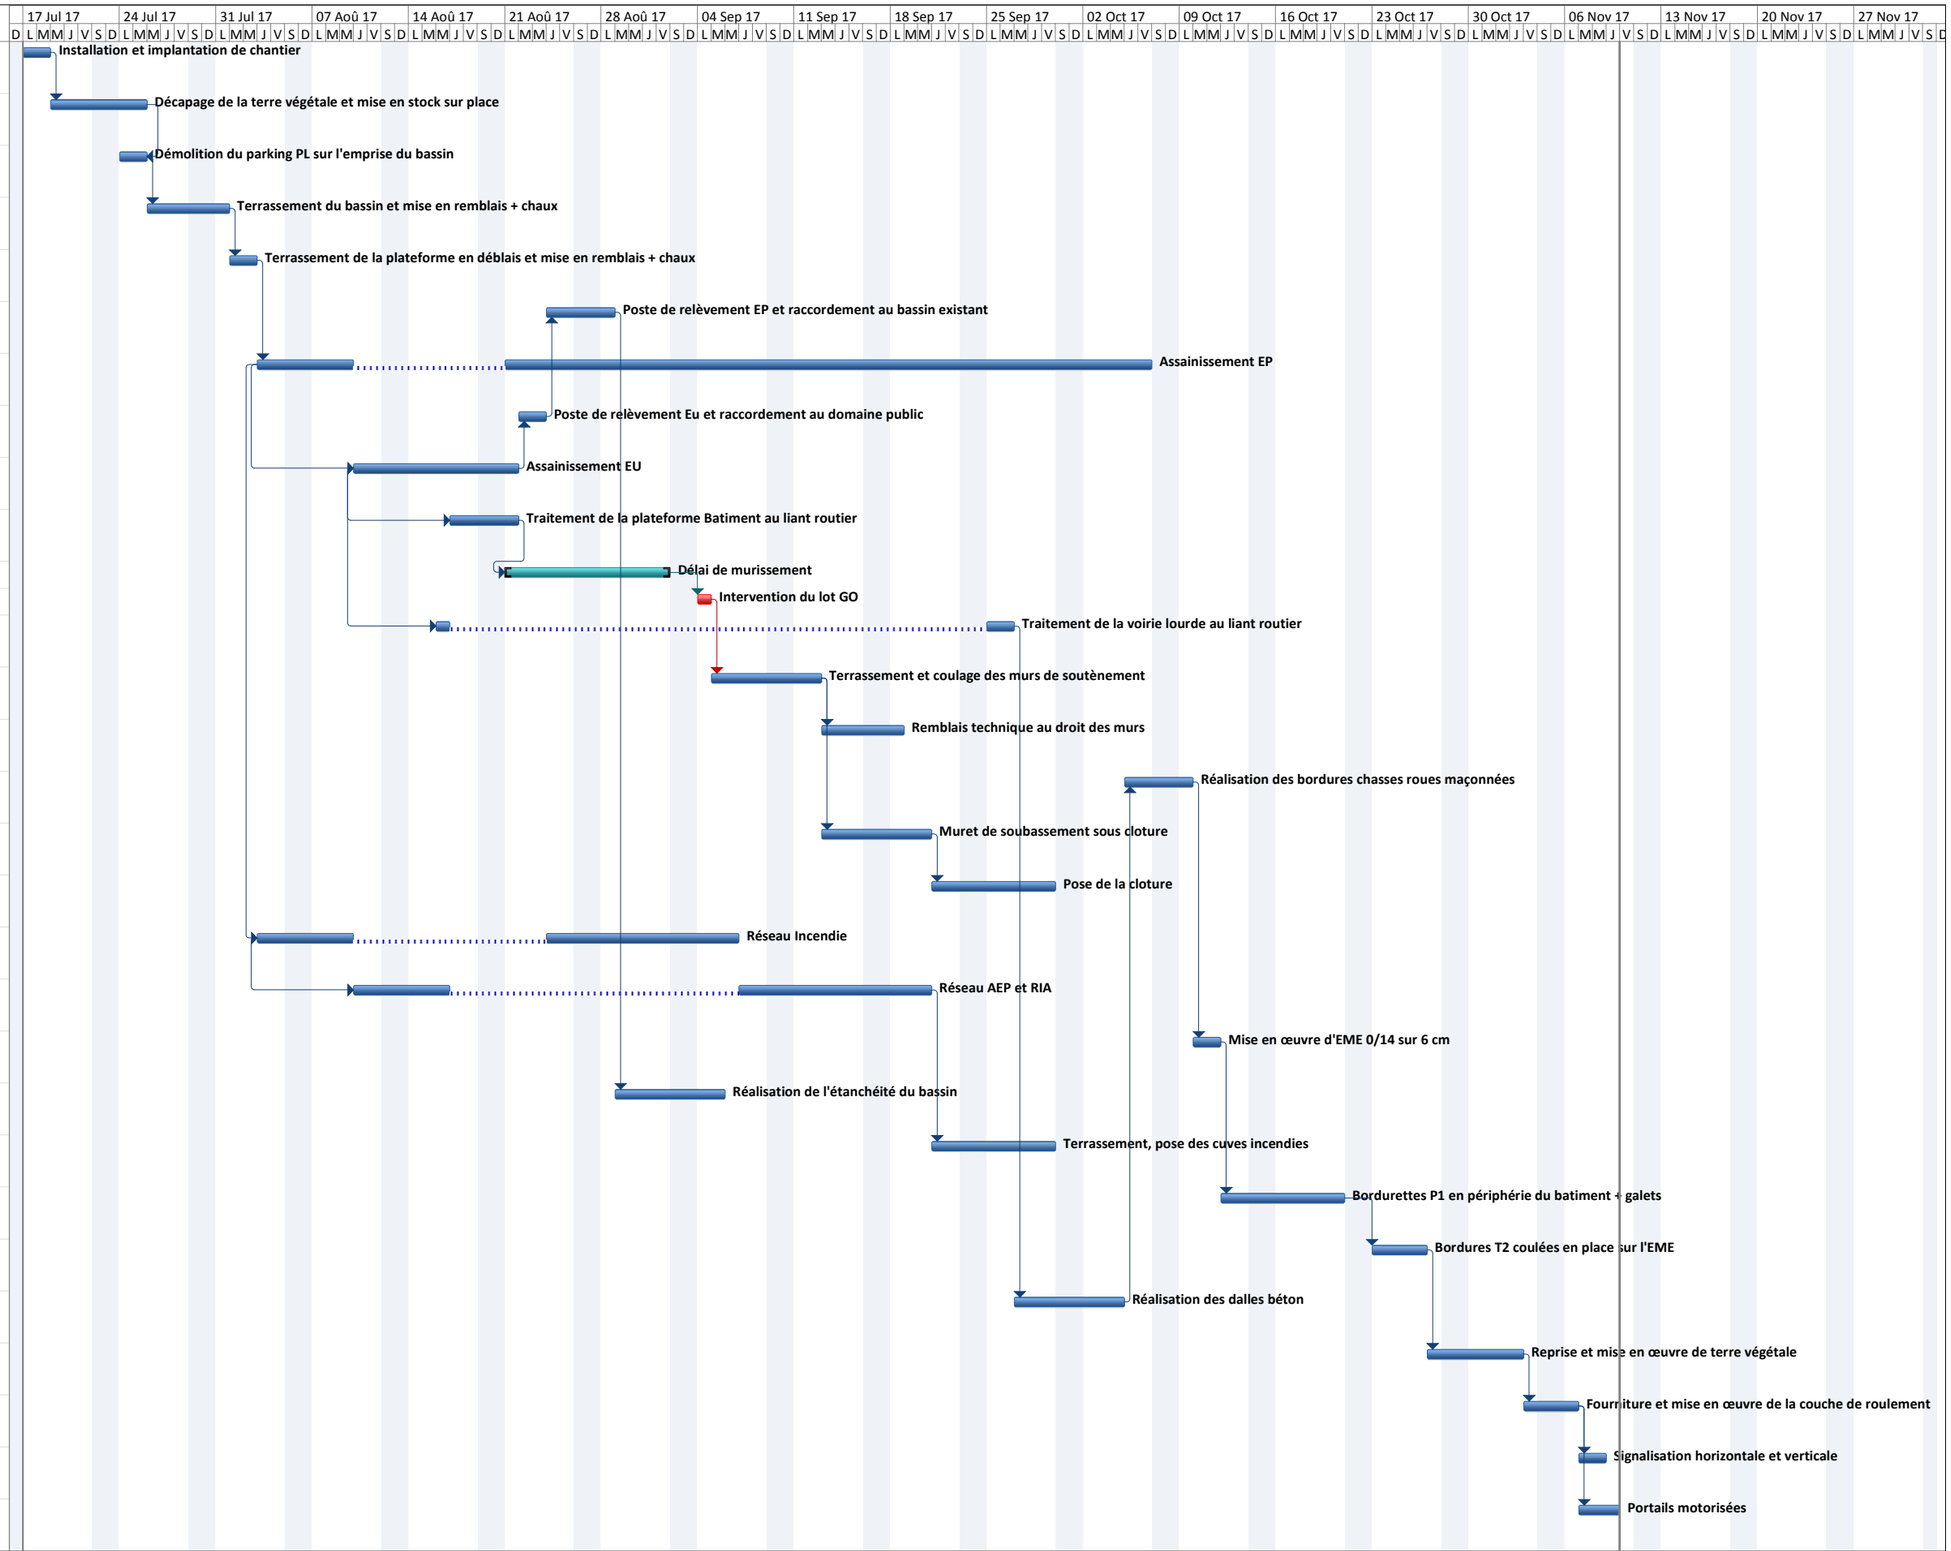

Projet : planning.mpp
Date : Lun 19/06/17

Tâche	Récapitulative	Jalons externes	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement		
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Échéance		
Jalon	Tâches externes	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Avancement		
