EIFFAGE ROUTE

Plateforme Logistique PIHEN
Commune de Remy

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Plateforme de Stockage PIHEN**	**160 jours**
2	**Phase 1**	**114 jours**
3	Lancement des DICT	10 jours
4	Etablissement des plans d'éxécution	15 jours
5	Présentation des produits et validation par le Maître d'Œuvre	5 jours
6	Installation de chantier	2 jours
7	Sondages divers	3 jours
8	Décapage de la terre végétale	12 jours
9	Terrassement du bassin EP	3 jours
10	Terrassement pour la réserve incendie	3 jours
11	Terrassement en déblais remblai	12 jours
12	Réalisation des assainssements	40 jours
13	Réalisation du réseau incendie	20 jours
14	Réalisation des réseaux divers	25 jours
15	Traitement de la plateforme et des voiries	12 jours
16	Murissement du traitement	8 jours
17	Mise à la cote des ouvrages	5 jours
18	Réalisation de la grave bitume	4 jours
19	Mise à disposition de la plateforme batiment	0 jour
20	Réalisation des clotures	10 jours
21	**Phase 2**	**56 jours**
22	Installation de chantier	1 jour
23	Pose des bordures	20 jours
24	Réalisation des dallages béton	10 jours
25	Remise en place de la terre végétale	2 jours
26	Finition des assainissements	12 jours
27	Finition des réseaux divers	8 jours
28	Finition AEP	10 jours
29	Réalisation des trottoirs et allées	10 jours
30	Pose des portails	4 jours
31	Réalisation des enrobés	5 jours
32	Signalisation	4 jours
33	Travaux divers de finitions	10 jours

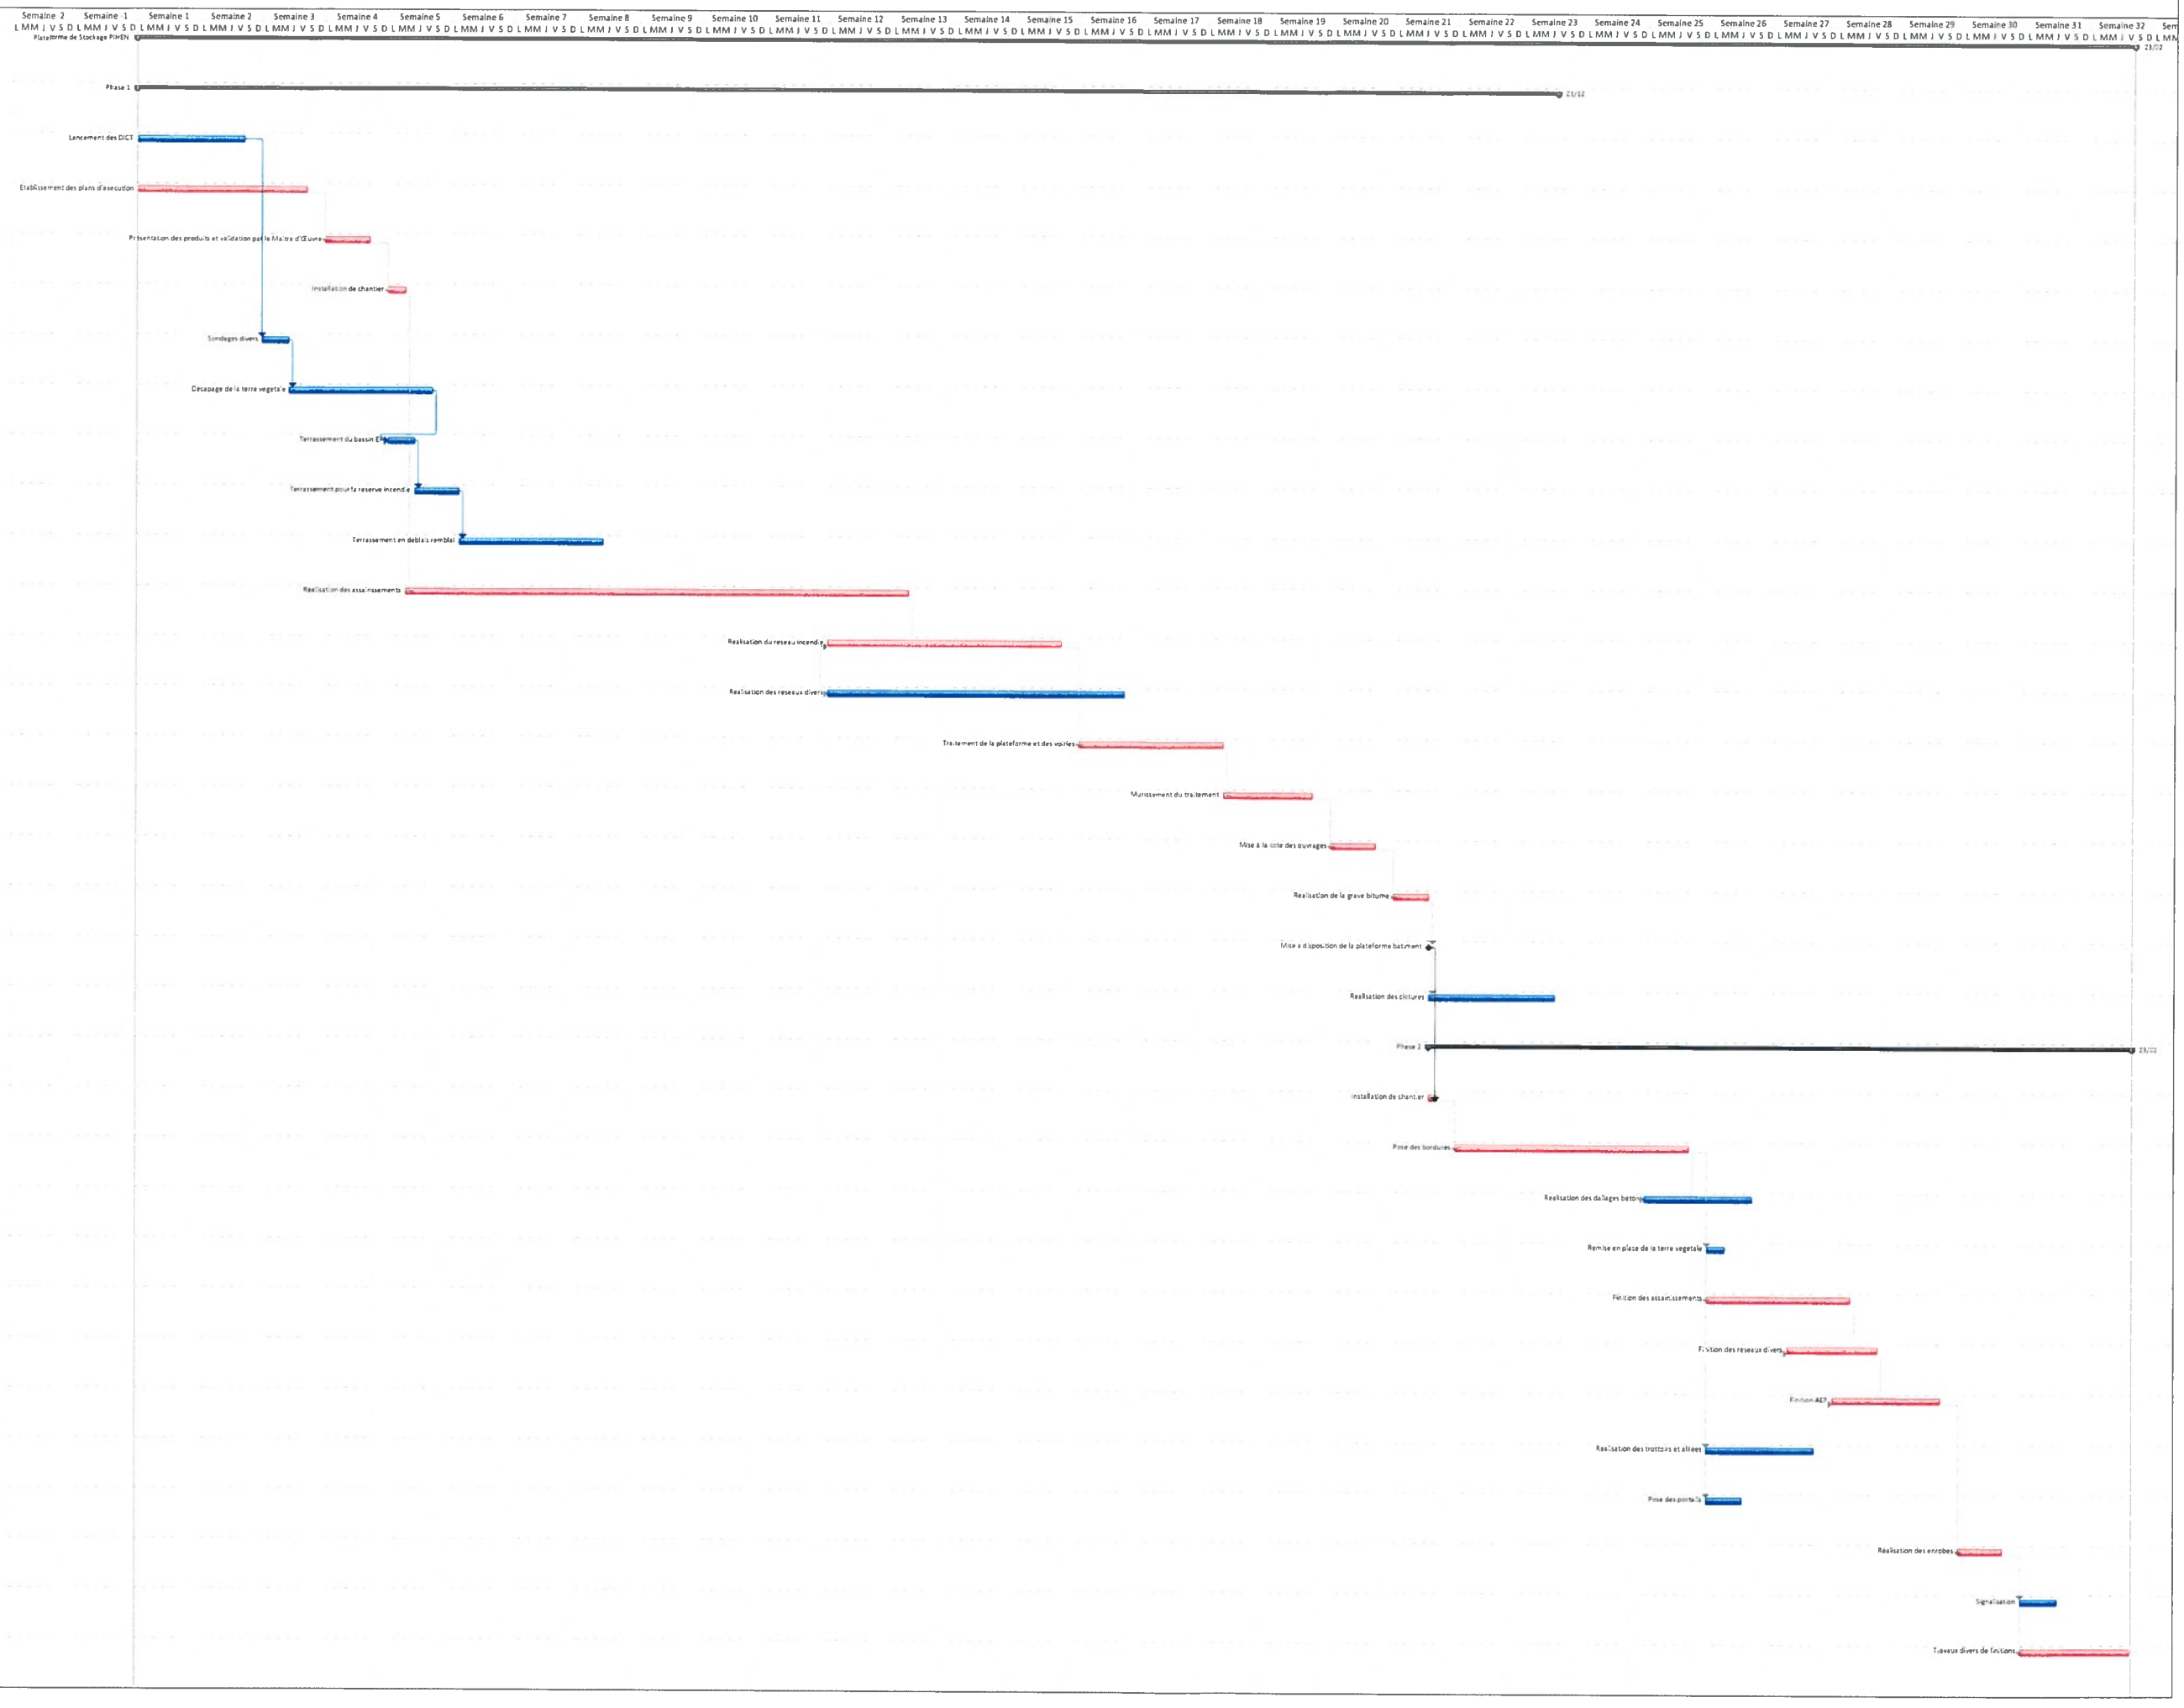
Semaine 2 Semaine -1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 30 Semaine 31 Semaine 32
L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D
